

A



A/48/19

الأصل: الإنكليزية

التاريخ: 21 يونيو 2010

جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

سلسلة الاجتماعات الثامنة والأربعون

جنيف، من 20 إلى 29 سبتمبر 2010

تقرير مرحلٍ عن مشروع البناء الجديد

من إعداد الأمانة

1. تحتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلٍ عن مشروع البناء الجديد (الوثيقة WO/PBC/15/19). وستقدم الوثيقة إلى لجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية المنعقدة في دورتها الخامسة عشرة من 1 إلى 3 سبتمبر 2010.
2. ويمكن الإطلاع على توصية اللجنة بخصوص هذه الوثيقة في "ملخص التوصيات الصادرة عن لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة من 1 إلى 3 سبتمبر 2010" (الوثيقة A/48/24).
3. إن جمعيات الدول الأعضاء في الويبو والاتحادات التي تديرها الويبو مدعوة، كل في ما يعنيه، إلى الإحاطة علماً بضمون الوثيقة WO/PBC/15/19 وبيان توصية، كما هي واردة في الوثيقة A/48/24.
[يلٰ ذلك المرفق]

A**WO/PBC/15/19**

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 8 يونيو 2010

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الخامسة عشرة

جنيف، من 1 إلى 3 سبتمبر 2010

报 告 书

关于新建筑项目的报告

تقدير مرحلٍ عن مشروع البناء الجديد

من إعداد الأمانة

4. الغرض من هذه الوثيقة تزويد لجنة البرنامج والميزانية ("اللجنة") بتقرير مرحلٍ عن مشروع البناء الجديد يغطي الفترة منذ رفع التقرير السابق عن مشروع البناء الجديد (الوثيقة 9 WO/PBC/14/9) إلى اللجنة إبان انعقاد دورتها الرابعة عشرة من 14 إلى 16 سبتمبر 2009.

مشروع البناء الجديد (مبني إداري جديد ومر الإضافي تحت الأرض بين مبني أرباد بوشك والمبني الجديد) تقدم ورشة البناء

5. لا تزال أعمال البناء تتقدم وفقاً لجدولها الزمني لتنهي في 8 أكتوبر 2010 (التاريخ الأصلي لانتهاء أعمال البناء محدد في العقد) فيما يتعلق بنحو 80% من المساحة المعنية، على أن تستكمل المساحة المتبقية، أي 20%， بحلول 5 نوفمبر 2010. وتشمل مساحة 80% من المبني الجديد الطوابق من الثاني إلى الخامس والطوابق من الثاني إلى الرابع تحت الأرض، وتشمل أيضاً الطابقين الرابع والخامس للمرم الإضافي تحت الأرض بين مبني أرباد بوشك والمبني الجديد. أما مساحة 20% فتشمل الطابق الأرضي والطابق الأول فضلاً عن الطابق الأول تحت الأرض، وتشمل أيضاً الطابقين الثاني والثالث للمرم الإضافي تحت الأرض بين مبني أرباد بوشك والمبني الجديد.¹

¹ تنتهي أعمال بناء مركز البيانات (الواقع تحت الأرض في المبني الجديد) في 25 سبتمبر 2010 طبقاً لما اتفق عليه في العقد في 2009 من خلال الإضافة المرفقة بالعقد المبرم مع المقاول العام، بحكم أن مركز البيانات المعلوماتية من أبرز التعديلات المدرجة في المشروع فيها عدا المواصفات التقنية الواردة في العقد الأصلي.

6. ويعزى أساساً تسلیم المشروع كاملاً في موعدين وحسب المواقع المحددة بوضوح في الإضافة المرفقة بالعقد، إلى خصامة الأعمال الإضافية المسندة إلى المقاول العام فيما يخص التعديلات (يغطيها المبلغ الخصص للتعديلات على المشروع (انظر الفقرة 10 أدناه)، والأعمال الطارئة (يغطيها المبلغ الخصص للنثريات والطوارئ) (انظر الفقرة 11 أدناه))، وتتفوق كلفة جميع هذه الأعمال الإضافية مبلغ 10 مليون فرنك سويسري أي نحو 10% من السعر الأصلي المحدد في العقد. وقد أثرت قسوة أحوال الطقس خلال شتاء 2009-2010 في تقدم أعمال البناء، فكان التأخير عن تسلیم جزء من المشروع سيطول لولا التدابير الهمامة التي سارع كل من قيادة المشروع والمقاول العام إلى اتخاذها في الورشة. وهذا التأخير لن يؤثر إلا في 20% من الأعمال التي ستنتغرق أربعة أسابيع إضافية فقط بعد مدة البناء التي كانت في الأصل 30 شهراً وكان مقرراً انتهاؤها في 8 أكتوبر 2010.
7. ووافقت لجنة البناء في مارس 2010 بناءً على توصية من قيادة المشروع والفريق الداخلي لمراقبة المشروع على ما يلي: "1" تسلیم المشروع في موعدين، "2" وإعداد إضافة ترافق بالعقد البرم مع المقاول العام من أجل تحديد موعد جديد في العقد لتسلیم 20% من الأعمال وغير ذلك من الشروط التعاقدية في هذا الصدد.
8. وسيخصص معظم الوقت خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة من أعمال بناء المبني الجديد ("المرحلة الأولى") والمر ت تحت الأرض بين مبني أرباد بوشك والمبني الجديد ("المرحلة الثانية") للواجهات والتثبيتات والتركيبات والإكماء الداخلي وأعمال التحسين والتجمیل في الأسقف وجاء من محیط المبني الجديد (علمًا بأن جزءاً من محیط المبني الجديد في الخريطة الأصلية سیتأثر بورشة بناء قاعة المؤتمرات والمحیط الأمني لمجتمع المبني).
9. وقد افتتحنا المنحدر الجديد لموقف السيارات تحت الأرض في مبني أرباد بوشك يوم 22 فبراير 2010 أي بعد ما كان مقرراً في الأصل (نوفمبر 2009)، ويعزى ذلك أساساً إلى رداءة أحوال الطقس.
10. وأما الحفر للمر ت تحت الأرض بين مبني أرباد بوشك والمبني الجديد ("المرحلة الثالثة")، بعد تعديله ليتناسب مع أعمال الحفر المتعلقة بمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة الموقّف عليه، فقد بدأت يوم 22 فبراير 2010. وستتواصل أعمال البناء في هذا الموقع تحت الأرض إلى أن يحل موعداً الانتهاء من هذه الأعمال في 8 أكتوبر 2010، حسب الطابق المعنى، وذلك تماشياً مع إتمام المرحلتين الأولى والثانية على التحوي المبين أعلاه.
11. ويرد في مرفق هذه الوثيقة الجدول الزمني المؤقت لمراحل البناء بعد تحديده.
- الاستفادة من الميزانية المقعدة والمبالغ المخصصة**
12. الجدير بالذكر أن اللجنة قد أوصت الجمعيات بالميزانية المعدلة والمحكمة لمشروع البناء الجديد (بما مجده 145 مليون فرنك سويسري تقريباً) فضلاً عن "المبلغ الخصص للتعديلات" وعن "المبلغ الخصص للنثريات والطوارئ" ووافقت جمعيات الدول الأعضاء عليها، في دورتها المنعقدتين في ديسمبر 2008 (وتقدر المبالغ التراكمية الإجمالية بما مجده 16 مليون فرنك سويسري) (الوثيقتان WO/PBC/13/6(b) (الوثيقتان A/46/12 وWO/PBC/13/10 (الفقرة 129 من التقرير) والوثيقة 12/10 من التقرير)).
13. وكما ذكرنا أمام اللجنة إبان دورتها الرابعة عشرة، فقد استخدمنا "المبلغ الخصص للتعديلات" (البالغ نحو 8,2 مليون فرنك سويسري) بكامله لتغطية تكاليف التعديلات الإضافية المتعلقة بمركز البيانات المعلوماتية، وتنفيذ التدابير الأمنية للأمم المتحدة في البناء الجديد، والاتصال عبر بروتوكول الإنترنت والتخطيط لمجموعة متنوعة من أماكن التخزين في البناء الجديد.
14. وحتى تاريخ هذه الوثيقة، استخدمنا "المبلغ الخصص للنثريات والطوارئ" (نحو 7,8 مليون فرنك سويسري) أو خصصناه لتغطية عدد من البنود بمبلغ يناهز 2,3 مليون فرنك سويسري. ويبقى الفارق البالغ نحو 5,5 مليون فرنك سويسري لتغطية المسائل الطارئة التي قد تحدث في الأشهر الأخيرة من البناء. وفيما يلي البنود المعنية:

(أ) التكلفة المتبقية للتخطيط لمجموعة متنوعة من أماكن التخزين في البناء الجديد (نحو 660 000 فرنك سويسري)، (ب) وأعمال تدعيم البنية التحتية تحت الأرض، وبعض تدابير السلامة والتداير الأمينة للأمم المتحدة داخل المبني الجديد وحوله، وبعض التعديلات البسيطة على التجهيزات الداخلية (نحو 650 000 فرنك سويسري)، (ج) وتكيف التجهيزات التقنية في الطوابق الأرضية القائمة في مبني أرباد بوكش والموصولة بالطوابق الأرضية الإضافية الجديدة (نحو 50 000 فرنك سويسري)، (د) إنشاء مر من الألياف البصرية أو مر خارجي إضافي للوصول بين مركز البيانات المعلوماتية وغيره من المبني (نحو 105 000 فرنك سويسري)، (ه) وصلاح تجهيزات نظم التدفئة والتقوية (نحو 60 000 فرنك سويسري)، (و) وتدابير السلامة من الحريق (نحو 450 000 فرنك سويسري)، (ز) وتدابير تقنية مختلفة في السقف والجدران الفاصلة بين المكاتب والردّهات (نحو 370 000 فرنك سويسري) والأتعاب المرتبطة بذلك (نحو 40 000 فرنك سويسري).

القرض وآثار المشروع على ميزانية الويبو العادية

الجدير بالذكر أن مبلغاً قدره 9,4 مليون فرنك سويسري قد أقر في وثيقة البرنامج والميزانية المعدلة للفترة 2008-2009 (في إطار البرنامج 29) من أجل تغطية أتعاب قيادة المشروع وفوائد القرض. وقد أجلنا سحب القسط الأول من القرض (مبلغ 50 مليون فرنك سويسري) المقرر سحبه في الأصل في ديسمبر 2008، حتى مارس 2009 بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. ومن ثم فإن المبلغ الموافق عليه في الميزانية العادية لم يستخدم بالكامل في الفترة المنكورة. وعلى غرار ذلك، فإن وثيقة البرنامج والميزانية المعتمدة للفترة 2010-2011 قد غطت (في إطار البرنامج 29) أتعاب قيادة المشروع وفوائد القرض مع افتراض أنها سنسحب قسطين آخرين في الفترة الممتدة بين نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011.

ولا تزال الميزانية العادية (البرنامج 24.4) تغطي تكلفة استئجار المكتب التي لا تملكتها الويبو في الفترتين الماليتين 2008-2009 و2010-2011 ريثما يتم المشروع. وستغطي الميزانية العادية كذلك في الفترة 2010-2011 تكاليف نقل الموظفين ومختلف التجهيزات والمعدات والمخزون إلى المبني الجديد، فضلاً عن تكلفة إخلاء المبني المستأجرة قبل إعادتها إلى أصحابها.

مياثاق الويبو لمشروعات البناء ودراسات المخاطر

خضع هذا الميثاق الذي تغيرت تسميته فأصبح "مياثاق الويبو لمشروعات البناء" (بدل "مياثاق مشروع البناء الجديد")، لعملية تقييم موسعة كي يشمل الأحداث أو العوامل الرئيسية التالية التي طرأت منذ إصدار النسخة السابقة من الميثاق (أي النسخة الثامنة، بتاريخ مارس 2009): (أ) التغيير في المفاهيم من خلال الفصل التام بين مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة بتخصيص فصل لكل مشروع على حدة، مما استدعته إعادة صياغة جزء من النص، (ب) والتعديلات الأخرى المدرجة في النص وفي جمع المرفقات التي أصبحت ضرورية بسبب تعدد عمليات التحديث البديهية (فريق إدارة عليا جديد وتشكيل لجنة البناء وفريق داخلي لمراقبة المشروع وبدء تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والنظام المالي الجديد ولائحة).

ويمكن الحصول على النسخة المدققة من الميثاق وهي النسخة التاسعة (2010)، بتاريخ 26 مارس 2010، التي قدمت إلى لجنة التدقيق في اجتماعها الذي عقد في أبريل 2010، عند الطلب.

ويتواصل تحديث دراسة المخاطر التي أعدتها الويبو، ودراسة الهيئة القيادية للمشروع بشأن المخاطر بوتيرة شهرية.

تنفيذ التدابير الأمنية للأمم المتحدة المتعلقة بمشروع البناء الجديد

20. يندرج تنفيذ جميع التدابير الأمنية للأمم المتحدة المتعلقة بالمشروع ضمن الأعمال الجارية وتغطى كلفتها من الميزانية المحكمة أو المبلغ الخصص للطوارئ، حسب نوع التدابير (انظر الفقرتين 10 و 11 أعلاه).
21. ونشير في هذا الصدد إلى التقرير المرحلي المنفصل المخصص لتنفيذ التدابير الأمنية للأمم المتحدة نظرا لارتباطه بمباني الويبيو الحالية.


مراقبة مشروع البناء الجديد والتدقيق فيه بانتظام

22. لا يزال مشروع البناء الجديد قيد التدقيق العادي الذي يتولاه مراجع الحسابات الخارجي ولجنة الويبيو للتدقيق وشعبة التدقيق الداخلي والرقابة.
23. وللجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى الإihatة على هذا التقرير المرحلي.

[يلي ذلك المرفق]

INDICATIVE CONSTRUCTION PHASE TIMETABLE FOR THE NEW CONSTRUCTION PROJECT
April 2008 to November 2010

(update : 30.04.10)

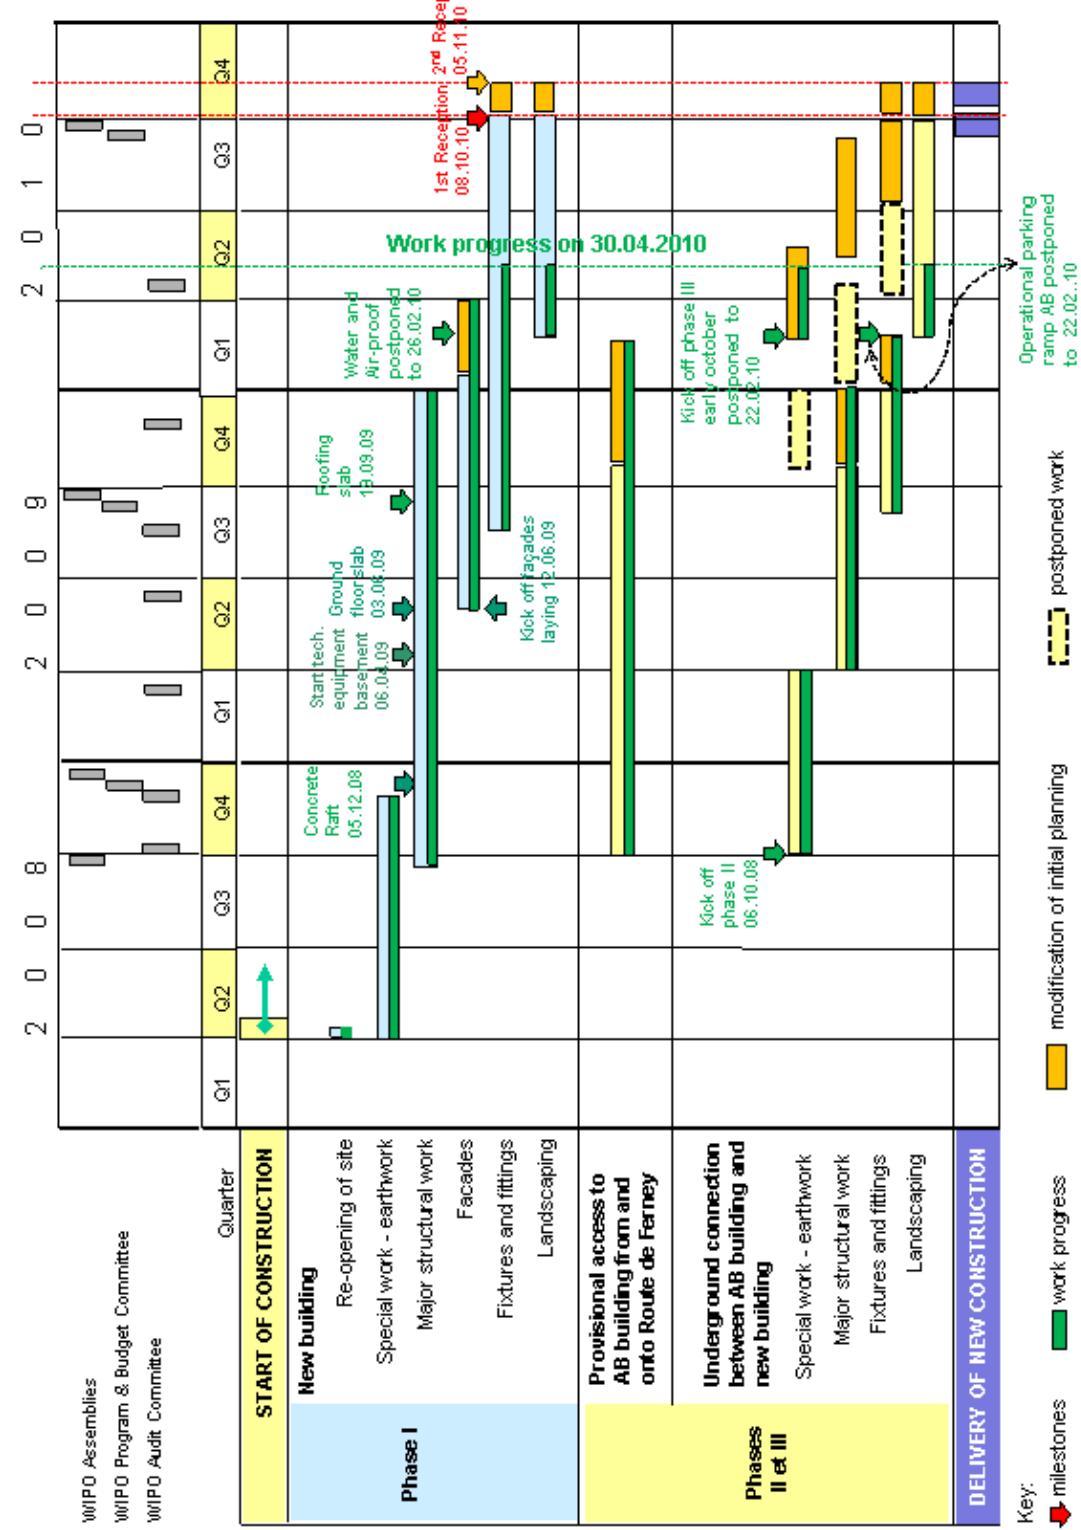

[نهاية الملف و الوثيقة]
